
GRIDONE

J1 · Roadmap BACS

Qualité des données et comptage

BACS exige un suivi énergétique horaire par zone fonctionnelle. J1 fiabilise les données qui justifient ce bilan.

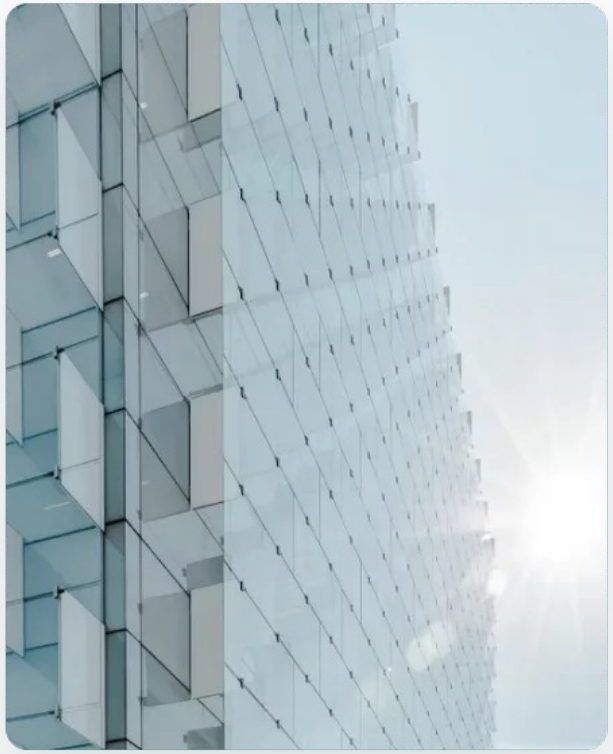

Direction · lundi 19 octobre 2026 · 10 minutes

Exigence BACS : FAQ ministérielle

Périmètre J1 : Linear

Six issues pour un bilan énergétique fiable

Issue	Résultat attendu	Statut	Priorité
AGR-1460	Qualité et provenance historisées	Todo	High
AGR-1462	Drivers et points du pilote qualifiés	Todo	High
AGR-481	Plan de comptage versionné	Todo	High
AGR-478	Couverture de chaque heure explicite	Backlog	High
AGR-1461	Calcul d'énergie fiable	Backlog	High
AGR-1463	Pertes visibles et reprise qualifiée	Backlog	Medium

À lancer : AGR-1460, AGR-1462 et AGR-481.

J1 et les six issues : Linear

Critères techniques : Notion

Trois étapes pour livrer J1

Étape	Issues à prendre	Résultat de passage
A Préparer le socle	AGR-1460 · AGR-1462 AGR-481	Observations, points et périmètre ont un contrat commun
B Produire les résultats	AGR-478 · AGR-1461 AGR-1463	Couverture et énergie explicites Panne puis reprise démontrées
C Réceptionner J1	Recette commune des six issues	Un bilan horaire par zone se recalcule et s'explique

Entrée : périmètre pilote validé avec AGR-477 (J0).

Durée et date cible à fixer après estimation et confirmation de la capacité.

Dépendances : Linear Recette DQ-1 à DQ-5 : Notion

Une recette qui prouve la fiabilité

Exemple : général 100 kWh = sous-comptages 60 + 15 + résiduel 25

Cas à tester	Preuve attendue
Heure constante, invalide ou manquante	États cohérents dans API, écran et export
Reset, trou ou changement d'heure	Énergie justifiée et lacunes visibles
Compteur déplacé dans une autre zone	Le bilan passé conserve son périmètre
Panne du chemin d'historisation	Reprise unique ou intervalle perdu déclaré

Livrable : un bilan pilote reproductible et son dossier de preuves.

J1 prépare J3 (diagnostic) et J4 (conservation). Il ne vaut pas attestation BACS.

Critère de sortie J1 : Linear Exemple de comptage : AGR-481

Les décisions attendues lundi

01 **Choisir le pilote et sa réception**

Zones, compteurs, versions installées et référent terrain identifiés.

02 **Lancer les trois lots prêts**

AGR-1460, AGR-1462 et AGR-481, avec un responsable par lot.

03 **Réserver la capacité et fixer les garanties**

Accès terrain, tolérance aux lacunes et niveau de reprise attendu.

Prochain point : revue des contrats, estimations et date cible de J1.

Proposition de lancement : Linear

Périmètre et recette : Notion
